

PERT Network Diagram Generator

Program analisis jalur kritis berbasis metode PERT untuk merencanakan dan mengoptimalkan alur peluncuran produk retail.

ANGGOTA KELOMPOK

Nama Anggota Satu
123456789

Nama Anggota Dua
987654321

STUDI KASUS

Alur Peluncuran Produk Baru — Retail

O Optimistic

Estimasi waktu terbaik jika semua berjalan lancar

M Most Likely

Estimasi waktu paling realistis dan sering terjadi

P Pessimistic

Estimasi waktu terburuk jika ada hambatan

Aktivitas Peluncuran

Reset ke default

O / M / P

Per Minggu

A

Finalisasi desain kemasan produk baru

— tidak ada —

O

2

M

4

P

8



B

Produksi massal tahap pertama

A x

O

5

M

8

P

14



C

Pembuatan konten iklan dan materi promosi

A x

O

3

M

5

P

9



D

Distribusi dan pengiriman barang ke gudang cabang

B x

O

4

M

6

P

10



E

Pelatihan staf toko mengenai keunggulan produk

B x

O

2

M

3

P

5



F

Peluncuran produk di toko dan media sosial

C x D x E x

O

1

M

2

P

3



+ Tambah Aktivitas

Hitung PERT

DURASI PROYEK

21.17 hari

$\sigma = 2.09$ hari

AKTIVITAS KRITIS

4

dari 6 aktivitas

AKTIVITAS NORMAL

2

slack > 0

JALUR KRITIS

A

Finalisasi desain kemas... 4.33



B

Produksi massal tahap ... 8.50



D

Distribusi dan pengirim... 6.33




F

Peluncuran produk di toko... 2

Jalur Kritis

Non-Kritis

Klik node untuk detail

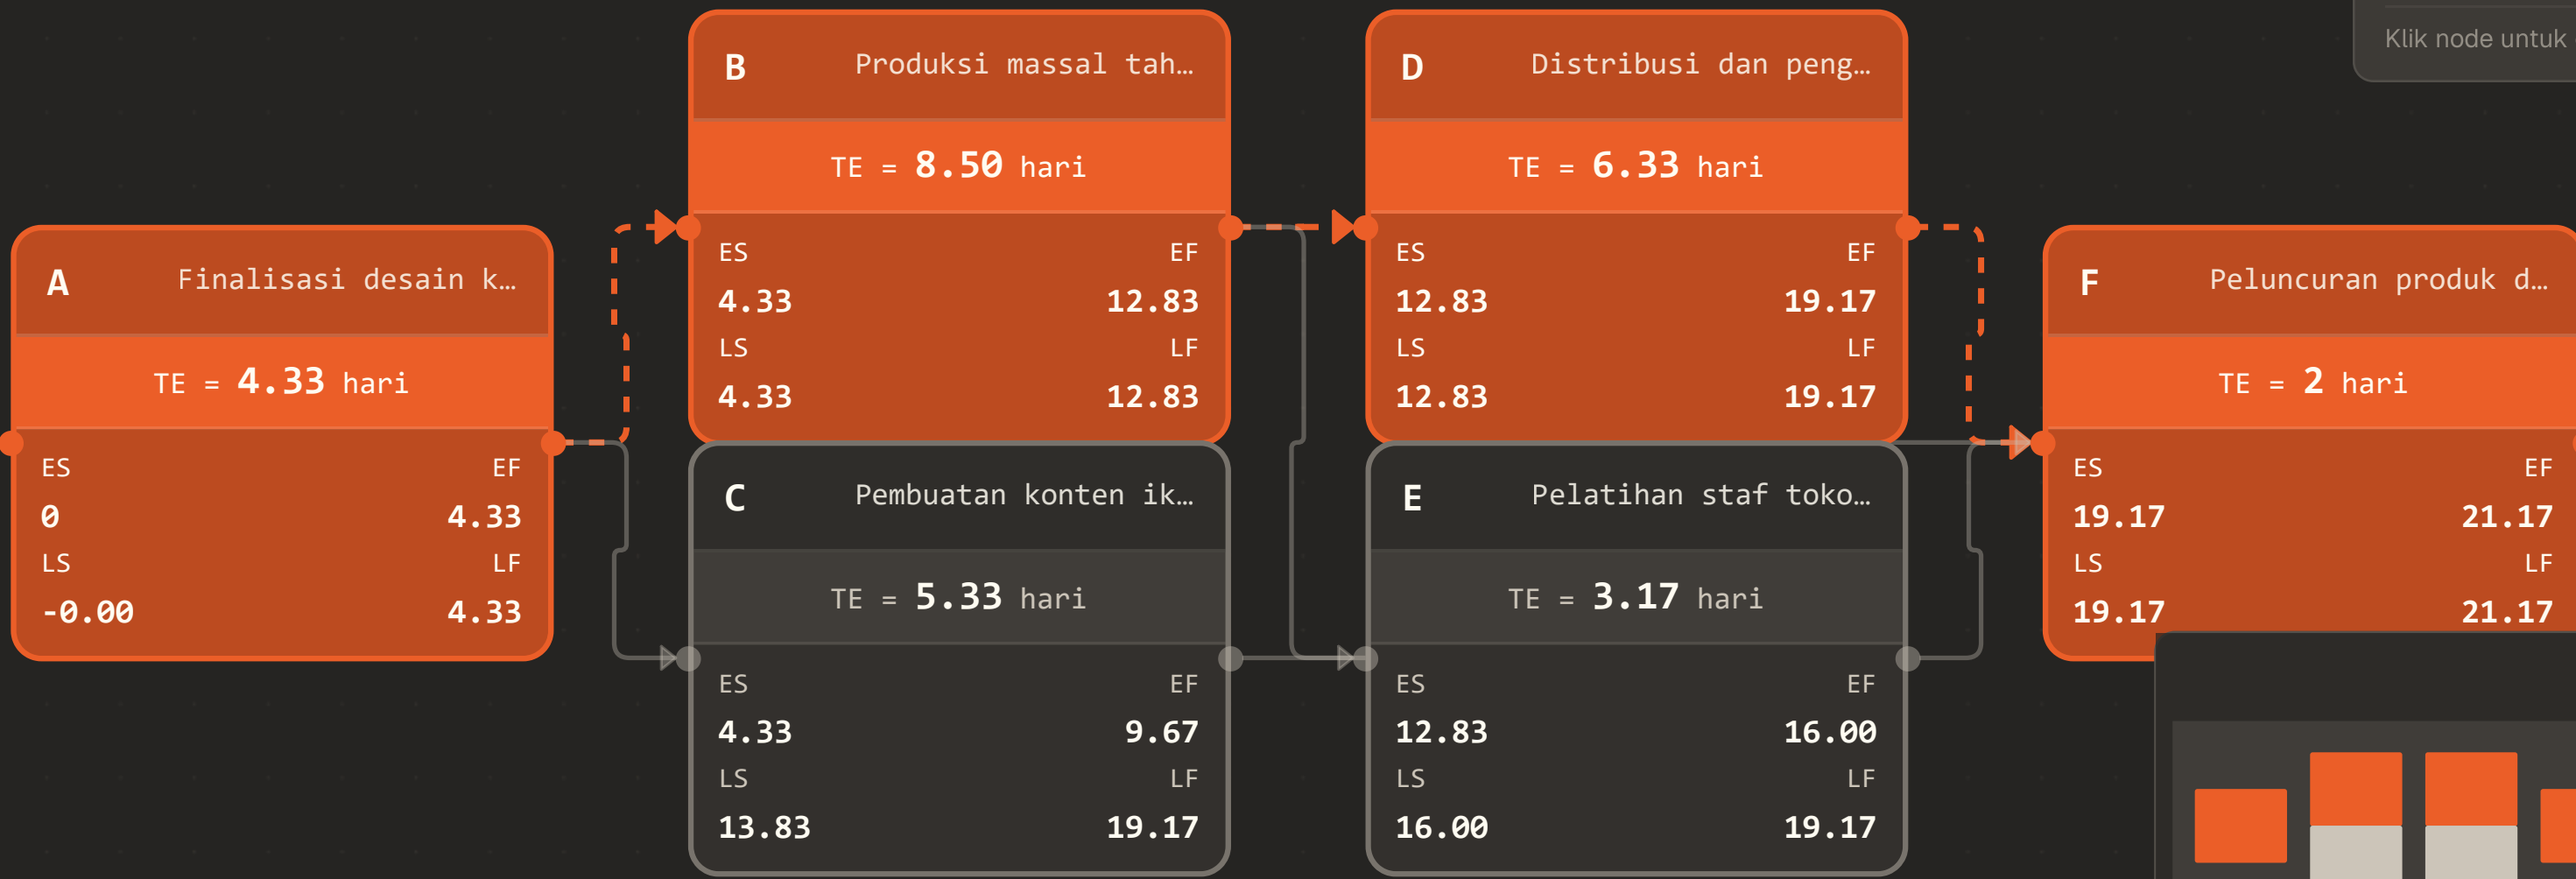

Tabel Hasil PERT 4 kritis / 6 total

ID	NAMA	O	M	P	TE	Σ^2	ES	EF	LS	LF	SLACK	STATUS
A	Finalisasi desain kemasan produk baru	2	4	8	4.33	1	0	4.33	-0.00	4.33	0	Kritis
B	Produksi massal tahap pertama	5	8	14	8.50	2.25	4.33	12.83	4.33	12.83	0	Kritis
C	Pembuatan konten iklan dan materi promosi	3	5	9	5.33	1	4.33	9.67	13.83	19.17	9.50	Normal
D	Distribusi dan pengiriman barang ke gudang cabang	4	6	10	6.33	1	12.83	19.17	12.83	19.17	0	Kritis
E	Pelatihan staf toko mengenai keunggulan produk	2	3	5	3.17	0.25	12.83	16.00	16.00	19.17	3.17	Normal
F	Peluncuran produk di toko dan media sosial	1	2	3	2	0.11	19.17	21.17	19.17	21.17	0	Kritis
